

共同研究項目

「医療法人財団 健友会（仮称）健友会小規模多機能福祉施設
太陽光発電新技術等フィールドテスト事業」

平成18年度共同研究業務成果報告書

平成19年5月15日

共同研究者：医療法人財団 健友会

理事長 菅 政和

目 次

1. まえがき
 2. 研究の成果と達成状況
 - (1) 研究の成果
 - (2) 目的に照らした達成状況
 3. 研究発表・講演、文献、特許等の状況
 - (1) 研究発表
 - (2) 文献
 - (3) 特許等
 - (4) その他の公表（プレス発表等）
 4. あとがき
- [添付資料]
- 1 システムデータ
 - 1-1 基本データ
 - 1-2 設備データ
 - 1-3 コストデータ
 - 2 完成写真
 - 3 単線結線図
 - 4 発注形態
 - 5 共同研究費（実績額）内訳書

1. まえがき

医療法人財団健友会が運営している（仮称）健友会小規模多機能福祉施設に太陽光発電 20kW システムを設置する事により、医療福祉分野の施設への導入促進 P R 効果や（仮称）健友会小規模多機能福祉施設を訪れる多くの来訪者や地域住民、当施設の職員などに、新エネルギー導入や地球温暖化問題に対して取り組む意識向上に繋がると期待し、太陽光発電システムを導入したものである。

2. 研究の成果と達成状況

（1）研究の成果

① 要約

（仮称）健友会小規模多機能福祉施設の屋上面に効率向上追求型 20kW 太陽光発電システムを設置し、三相 10kW インバータ 2 台を介して、施設内全体にその電力を供給しています。当施設の実負荷の下で発電運転を開始し、順調に各種運転データの収集を行っています。

② 本文

（仮称）健友会小規模多機能福祉施設の屋上面へ陸屋根型一段方式の架台を設置し、その架台に 20kW の太陽電池を設置しました。

各機器間の配線距離を最短距離になるように配慮した結果、発電電力の損失を最小限に抑え、電気工事コストも削減することができた。

長期間より多くの発電量を得る為、電力変換効率 92% 以上のインバータを採用した。また、工事工数や機器購入費を低減する為に接続箱・トランスデューサ内蔵のインバータを採用した。

各種運転データは、日射量、気温、各種発電データがパーソナルコンピューターによって表示され、日々刻々とデータ収集しており、各種データを定期的に報告し、太陽光発電システムの信頼性、安全性を実証すると共にそのデータを広く一般に公表する。

なお、システムデータを添付資料 1 に、完成写真を添付資料 2 に示す。



(2) 目的に照らした達成状況

太陽光発電設備導入の為に計画立案、設計、工事に関する技術及び知識、経験などを蓄積することができ、今後、太陽光発電設備導入を計画しようとしている福祉関連施設の関係者へ蓄積した技術及び知識や経験を提供し、長崎県に多くの太陽光発電設備が導入される様助力する。

太陽光発電運転開始後、多くの来訪者や地域住民などが健友会小規模多機能福祉施設に設置した太陽光発電に興味を示し、多くの質問や問い合わせがあり、予想以上の太陽光発電システム導入によるPR効果があると驚いており、このPR効果を更に伸ばす為に地方自治体や民間環境団体と協力して各種運転データの提供や地元小中学校や地域住民に対し、太陽光発電の見学会・学習会などを計画し、地域密着型の環境意識向上や新エネルギー導入促進活動を行う。

3. 研究発表・講演、文献、特許等の状況

(1) 研究発表

なし。

(2) 文献

なし。

(3) 特許等

なし。

(4) その他の公表（プレス発表等）

なし。

4. あとがき

太陽光発電設備の導入は、地球温暖化の主因である二酸化炭素を排出する原因になっている化石エネルギーによる電力エネルギー供給の低減に貢献し、また、地球温暖化による環境汚染や環境破壊を抑える大変意義のある環境貢献事業である。

今後、化石エネルギー抑制や環境保全に大きな役割を担う太陽光発電の導入促進を積極的に行い、地球温暖化防止につながる環境負荷低減に取り組む。

システムデータ

1. 基本データ

(採択番号 8703201)

項 目		デ ー タ		備 考
事業年度		平成18年度		
事業名		太陽光発電新技術等フィールドテスト事業		
設備	名称	(仮称) 健友会小規模多機能福祉施設太陽光発電システム		
概要	システム種別	新型モジュール採用型	CIS型・粒状型・両面発電型・その他 ()	
		建材一体型	屋根材一体型・壁材一体型・ガラス一体型・その他 ()	
		新制御方式適用型	防災型・ヒートカット型・融雪型・その他 ()	
		効率向上追求型	計画時予想システム効率 0.755	
	設備容量	20.0 kW (インバータ容量: 20 kW)		
設置方式	地上架台 屋上架台 屋根架台・屋根直付・建材一体			
用途	空調設備・一般動力用			
PV完成日	平成19年2月23日			
運転開始日	平成19年2月23日			
PV設備価格	19.8 百万円			
説明	説明文		成果報告書本文参照	
設置	名称	(仮称) 健友会小規模多機能福祉施設		
場所	住所	長崎県		
		長崎市戸町4丁目178番10		
位置	北緯 32度43分 東経129度51分			
用途	庁舎・学校・工場・倉庫・病院 老人福祉施設 公民館・図書館・博物館・事務所・店舗・駐車場・その他 ()			
構造	新築 既築			
	鉄筋コンクリート造 鉄骨造・プレハブ・木造・その他 ()			
規模	延床面積	4,496.93 m ²		
	階数	地上4階、地下0階		
写真	太陽光発電システムの設置状況写真		添付資料2参照	
設置者	共同研究者名	医療法人財団 健友会		
	住所	長崎県		
		長崎市下町2番11号		

2. 設備データ

(採択番号 8703201)

項 目		データ	備考
単線結線図		(図面)	添付資料3参照
太陽電池モジュール	メーカー	松下環境空調エンジニアリング(株)	
	型式	ND-U0L5H	
	種類	単結晶、 ~~多結晶~~ a-Si、()	
	変換効率	12.27%	
	最大出力	200W	
	外形寸法	1,640mm×994mm×46mm	
	重量	21.0kg	
アレイ	モジュール数	100 枚	
	モジュール構成	10直列×10並列	
	最大出力	20,000kW	
	設置傾斜角度	5度	(日射計の設置角度:5度)
	設置方位(東を90度とする真北からの角度)	177度 (16分割方位)	16分割方位も同時記載 (日射計の設置方位:南)
架台	製作メーカー	ニーテックハマナカ	
	材質・仕上げ	高耐食溶融メッキ鋼板/ステンレス	
	総重量	0.98t	
インバータ	メーカー	山洋電気	
	型式	P73D103KJ	
	運転入力電圧範囲	DC200~500V	
	連系点電圧	三相3線 AC202V	連系箇所及び交流出力電圧
	連系運転範囲	電圧	202±20V以内
		周波数	60±1%以内
	定格容量および台数	10kVA(kW)×2台	
	過負荷耐量	110% 連続	
	電力変換効率	92%以上	
	インバータ設置場所	R階倉庫室内	
	外形寸法	700mm×600mm×280mm	
	重量	60kg	
	接続箱内蔵・TD内蔵 等	接続箱内蔵・TD内蔵	
接続箱	設置台数		
	材質		
蓄電池	メーカー		
	型式		
	運転電圧		
	定格容量		
	台数		
	接続方法		
データ計測装置	PCメーカー	エプソン	
	PC型式	Endeavor AT960	
	計測ソフトメーカー・型式	コンテック・計測ソフト Ver5.00	
表示盤	メーカー・型式		
	仕様		
連系方式		動力配電線に連系	
逆潮流検出リレー設置の有無		有り	
売電用メーター設置の有無		無し	
契約電力会社		九州電力	
契約名・契約種別		業務用季時別電力A	
買電価格		10.29円/kWh	その他季の単価
契約電力		100kW	
売電価格(逆潮流あり時のみ)			

3. コストデータ（消費税は除く）

（採択番号 ８７０３２０１）

項 目		データ [百万円]	備 考
土木建築 工事費	基礎関係工事費	1.1	- 詳細は添付資料５に記載 () 内は、計測装置関係を除いた額
	装置据付等工事費	2.5 (2.3)	
	試験調整費	0.5 (0.4)	
	電気配線配管等工事費	1.7	
	表示装置関連工事費	0	
	小 計	5.8	
機械装置 等製作・ 購入費	太陽電池本体	9.8	
	インバータ	2.7	
	アレイ架台	1.8	
	キュービクル	0.0	
	システム保護装置等	0.0	
	データ計測装置等	1.1	
	表示装置	0	
	小 計	15.4	
F T 事業対象設備の設置費用合計		21.2	(A)・・・PV設備価格
同（計測・表示装置除く）		(19.8)	

完 成 写 真 1



写真 1．システム全景及び太陽電池モジュール周囲状況（西方面）



写真 2．システム全景及び太陽電池モジュール周囲状況（北方面）

完 成 写 真 2



写真 3．システム全景及び太陽電池モジュール周囲状況（東方面）



写真 4．システム全景及び太陽電池モジュール周囲状況（南方面）

完 成 写 真 3



写真 5 . 日射計



写真 6 . 気温計

完 成 写 真 4



写真7. パワーコンディショナ



写真8. 連系用ブレーカー

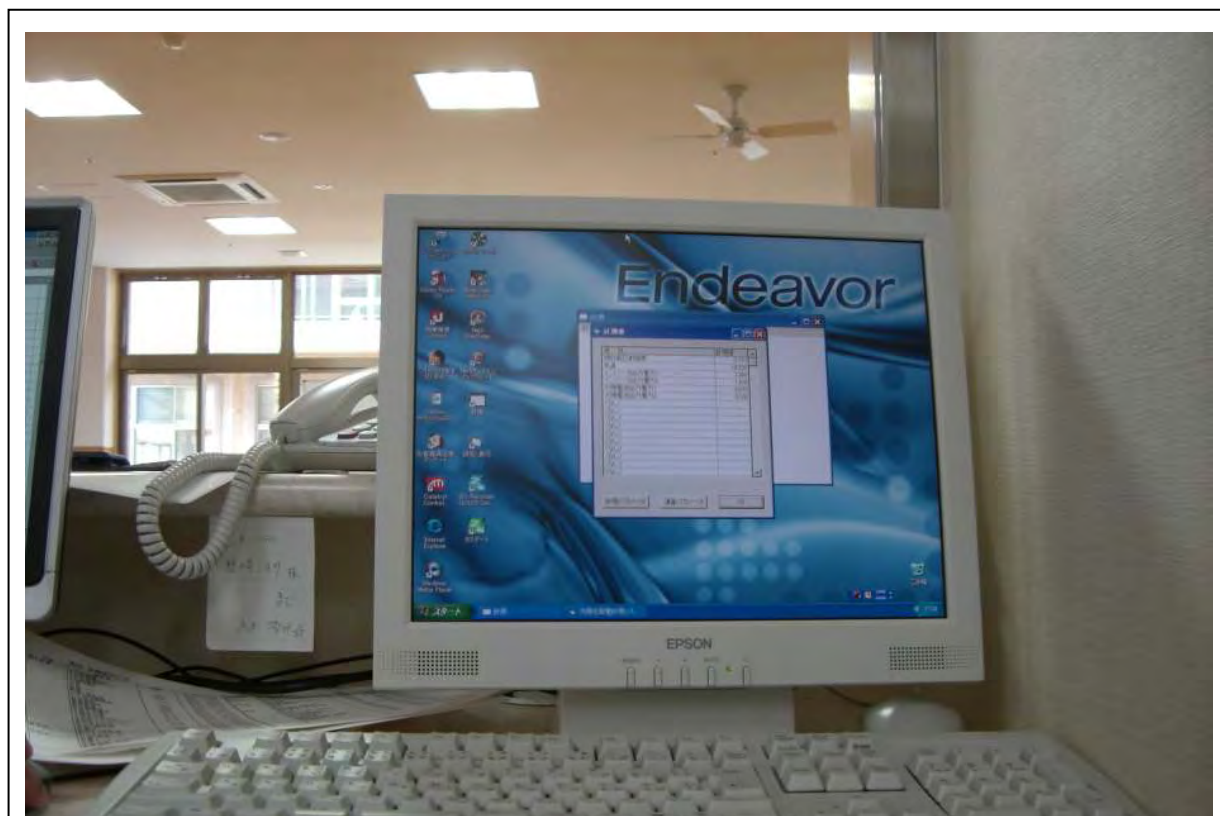


写真 9．データ収集装置

- 添付資料 3－1 施工図・単線結線図
- 添付資料 3－2 モジュール結線図
- 添付資料 3－3 モジュール試験成績書

（仮称）健友会小規模多機能福祉施設
太陽光発電設備設置工事
（太陽光発電新技術等フィールドテスト事業）

工 事 完 成 図
（太陽光発電 20 kW システム）



株式会社 ニーテックハマナカ

特 記 仕 様 書

工 事 名 称	(仮称) 健友会小規模多機能福祉施設太陽光発電新技術等フィールドテスト事業電気設備工事
工 事 場 所	長崎県長崎市戸町4丁目178番10
納 入 期 限	平成19年 2月 23日
システム概要	設備の概要 発電設備の種類 : 太陽電池発電所 設備容量 : 太陽電池容量 20,000kW (200W×100枚/10直列10並列) : インバータ容量 20kW (20kW×1台) 連系する電力系統: 高圧一般配電線(単相3線、105V/210V、6.6kV、50Hz) 逆潮流の有無 : 無し
一 般 事 項	1. 本工事は下記の法令・省令・規格等の準拠し、添付の設計図書に則り、完全に施工する事。 (1) 労働基準法 (6) 建築基準法 (2) 労働安全衛生法 (7) 日本工業規格(JIS) (3) 電気事業法 (8) 日本電機工業会標準規格(JEM) (4) 電気設備技術基準 (9) 日本電気規格調査会標準規格(JEC) (5) 消防関係法規 (10) 日本電線工業会規格(JCS) (11) 電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン(平成16年10月1日改訂) (12) 分散型電源系統連系技術指針(JEAG 9701-2001)準用 2. 仕様決定の優先順位は、太陽光発電システム見積仕様書及びFT事業標準仕様書、見積合わせ用図面の順とする。 3. 図面に疑義が生じた場合は速やかに質疑し、回答の指示に従って施工する事。 4. 本工事着手に際しては、着工届として書類にて通知すると共に工事工程表など係員が指示する事項を着工書類として提出する事。 5. 本工事着手に際しては、納入仕様書・製作図・施工図を予め提出し承認後、係員の指示に従って施工する事。 6. 本工事に要する諸官庁その他への申請手続きは、施工者の負担にて遅延なき様速やかに行う事。 7. 本工事施工に際し、設計図に記載なき事項についても技術上、機能上、当然必要と思われる事項については、請負者の負担にて完全に施工する事。 8. 工事完成に際しては、係員の指示により、システム総合試験検査を実施し試験成績書を作成し提出する事。 9. 工事完成後、下記書類を作成し完成図書として提出する事 工事完成図・メーカーリスト・機器完成図・取扱説明書・試験成績書・申請書写・施工写真・保証書・連絡体制・その他係員が指示するもの 10. 検収後1年以内に、設計もしくは製作不良、その他工事者の責任に帰すべき不具合が生じた場合は、速やかにこれを無償で修理、または、良品と交換するものとする。 なお、上記保証期間を経過した後に、機器製作不良等工事者の責任に帰すると判断される原因により事故が発生した場合、その修理・取替えに要する費用については、協議の上決定するものとする。
システム構成	本システムは、太陽電池モジュール、インバーター(接続箱内蔵、TD付)、日射計、気温計 データ収集装置等により構成される。 ①太陽電池は太陽からの日射を受けると直流電力を発生し、これをインバータ内にある接続箱で集電される。 ②インバータは、この直流電力を並列する商用電源の電圧、周波数、位相と同期した交流電力に変換し、対象とする 負荷へ電力を供給する。 ④連系保護装置等により、インバーター及び系統の異常時には連系を遮断する。 ⑤運転データは、データ収集装置により収集する。 ⑥日射計は、太陽電池設置角度と平行に設置し、計測した日射量データは、データ収集装置による収集する。 ⑦直射日光に当たらない場所に設置した気温計より計測した気温データは、データ収集装置により収集する。
運 転 方 式	インバーターは、下記の通り全自動運転を行うものとする。 ①太陽電池の動作特性を監視し、設定値に達するとインバーターを自動的に起動する。 ②太陽電池の出力を監視し、設定値以下になると自動的に運転を停止する。 ③太陽光発電システムによる負荷への電力供給は、原則として昼間のみを対象とする。昼間に日射不足により給電 不能となる場合は自動的に運転を停止させる。 ④太陽電池出力監視による発電装置自動停止後の復帰は時限を採って行い、不要な高頻度のポンピングを避ける。 ⑤交流系統に事故が発生した場合やインバーター故障時は、速やかに商用系統との連系接続を解列し確実に停止する。 ⑥商用系統の事故の場合は、商用系統が復旧すれば確認後、自動的に再投入して運転を再開する。



[illegible]

				Approve	Check	Drawing	Project Title （仮称）健友会小規模多機能福祉施設太陽光発電設備設置工事	Date H19.02.23	Drow No. 1 6 枚の内
							Drawing Title 特記仕様書	Scale	

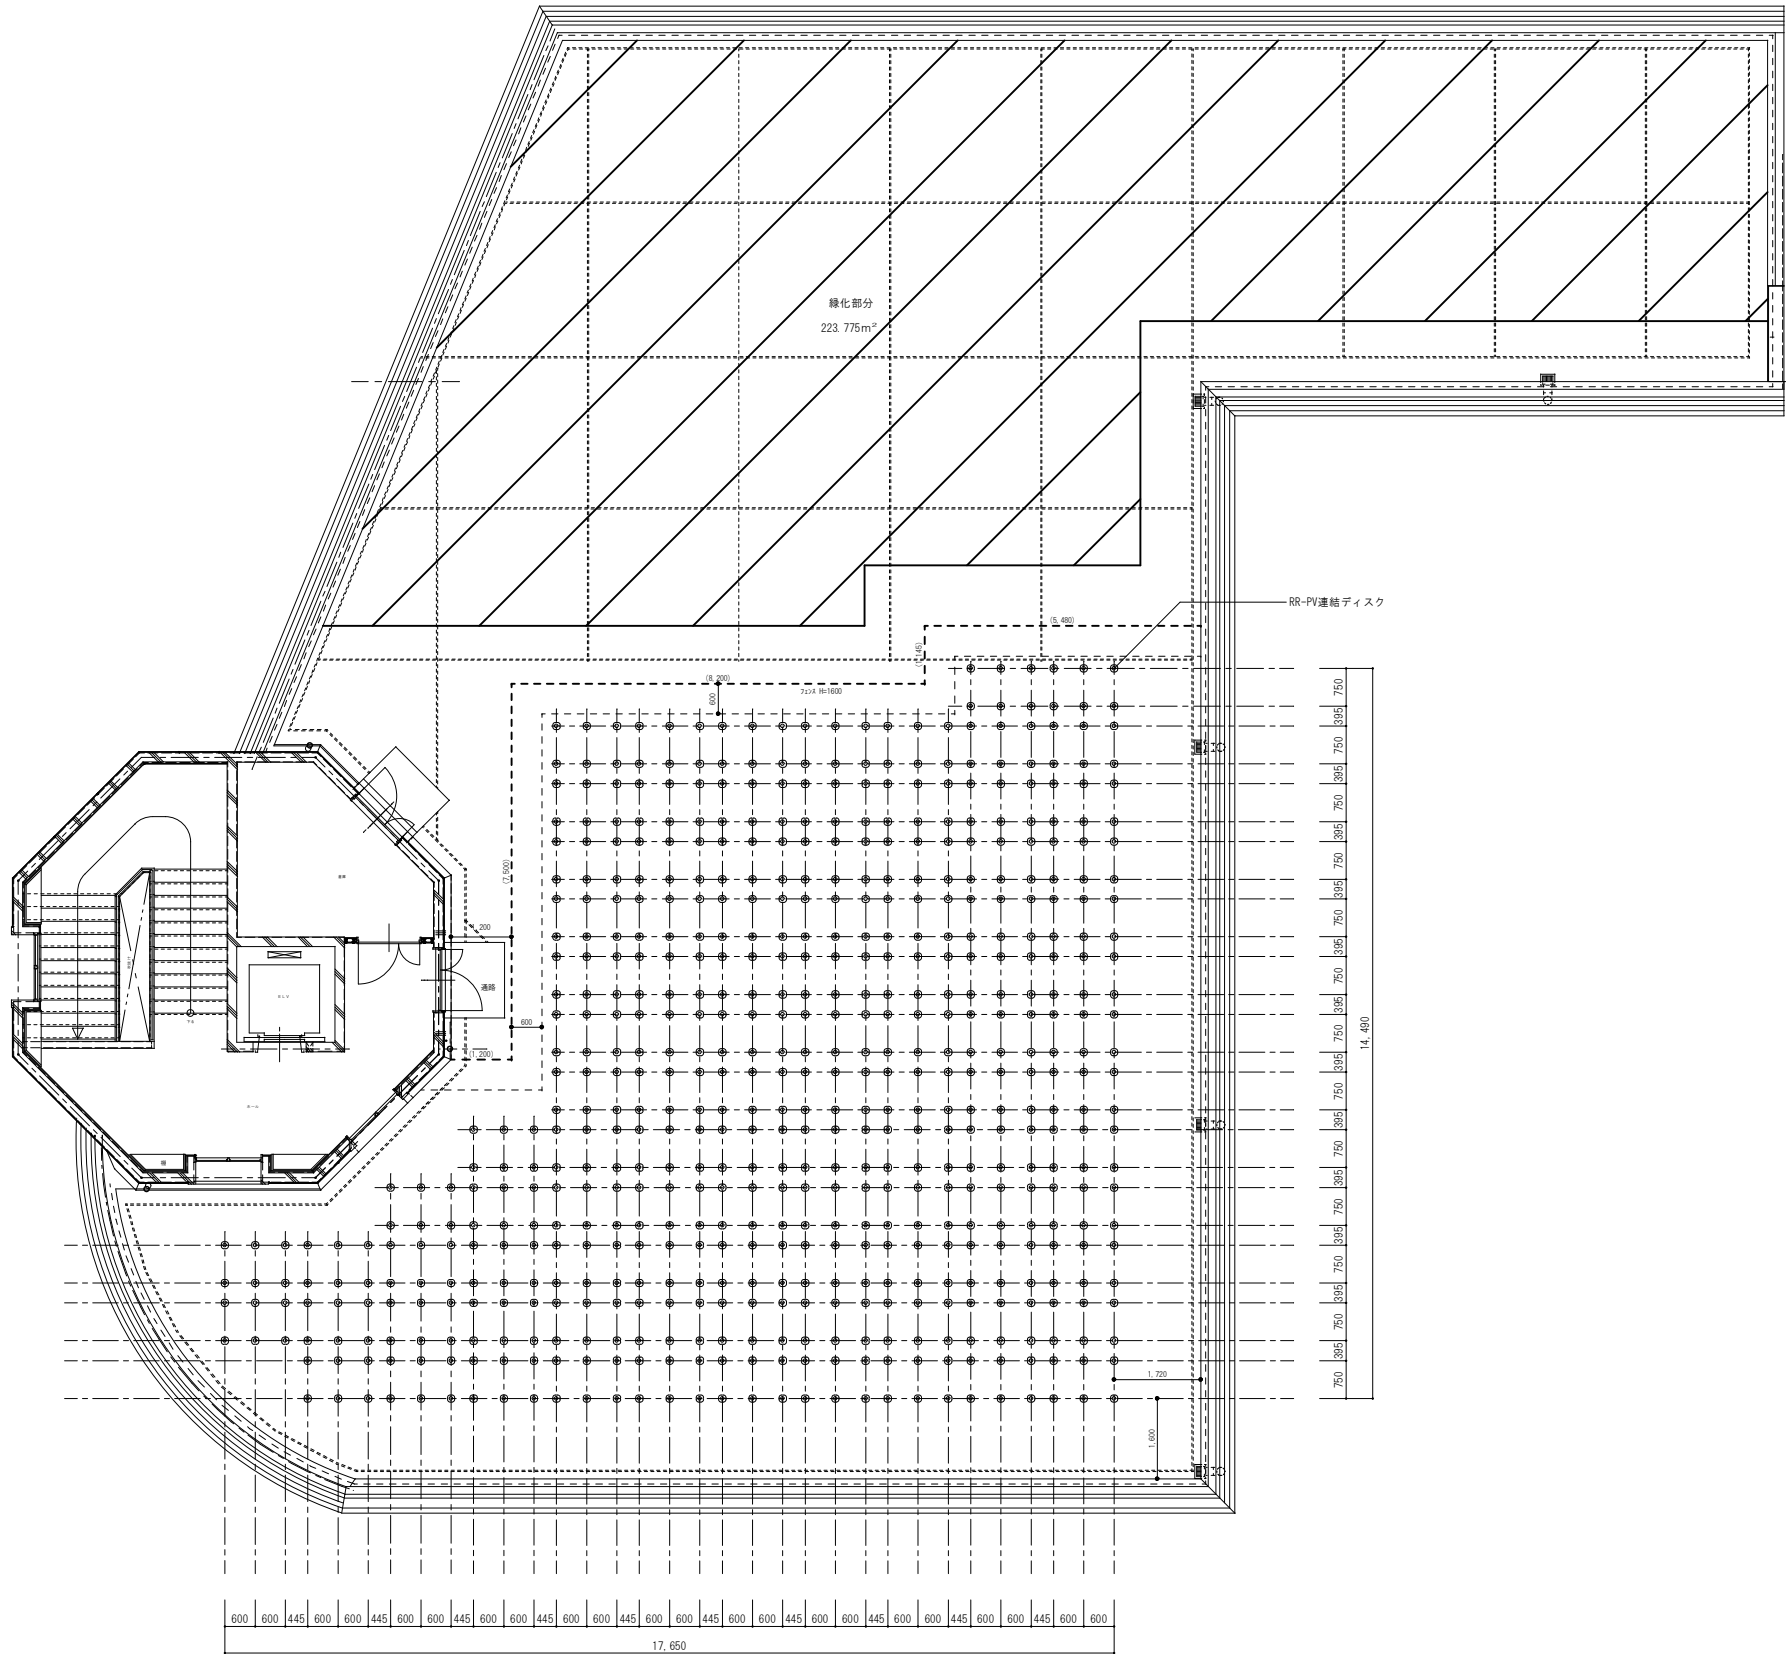


				Approve	Check	Drawing	Project Title	Date	Drow No.
							(仮称) 健友会小規模多機能福祉施設太陽光発電設備設置工事	H19. 02. 23	
							Drawing Title	Scale	5 6
							固定ボルト（連結ディスク）位置図	S=1/150	


西棟搭屋屋根伏図

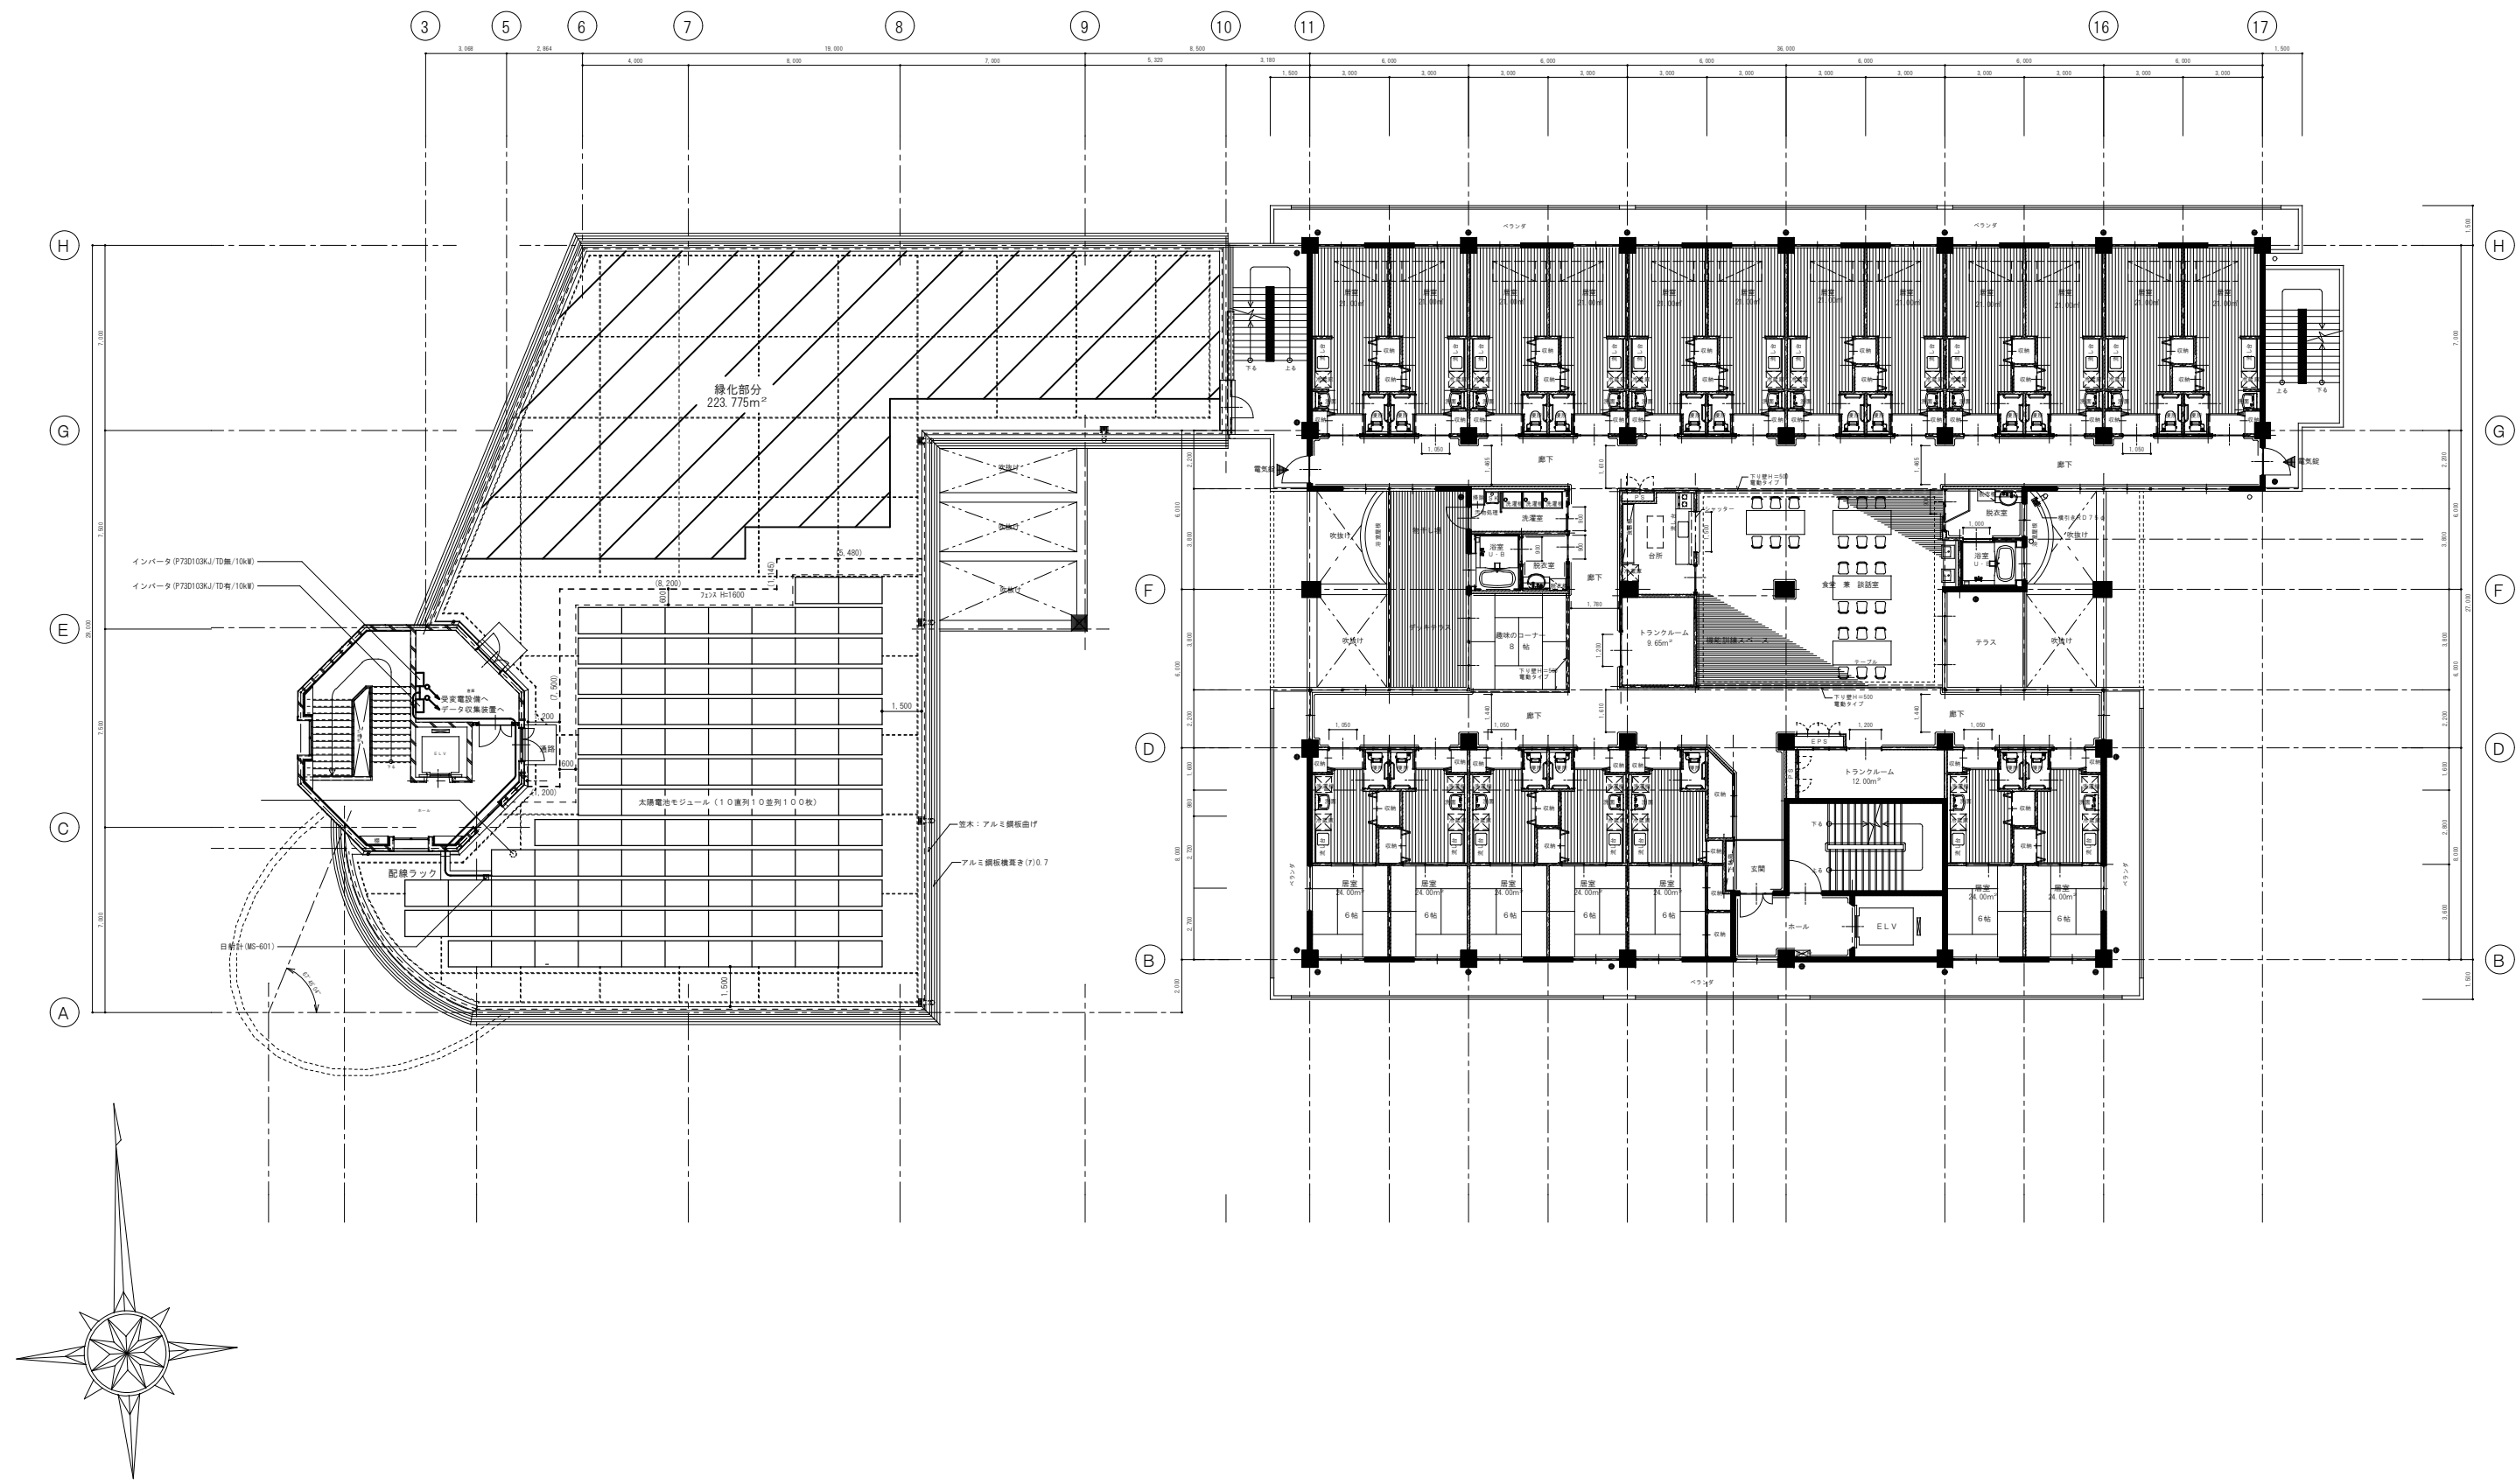

				Approve	Check	Drawing	Project Title	Date	Drow No.
							(仮称) 健友会小規模多機能福祉施設太陽光発電設備設置工事	H19. 02. 23	
							Drawing Title	Scale	3 6
							太陽電池配置図 (屋上平面図)	S=1/250	


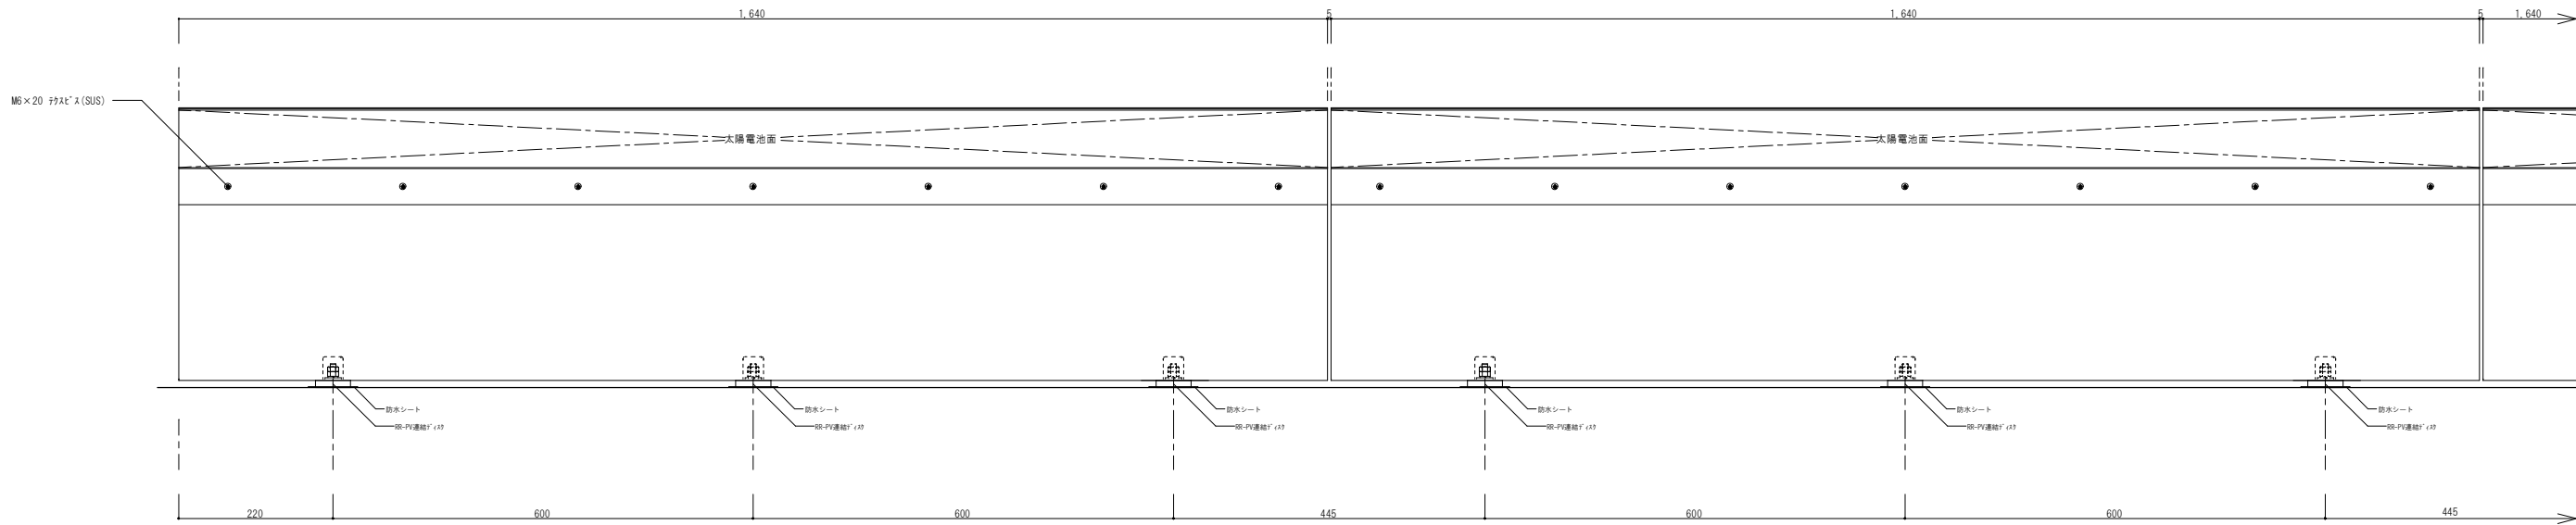


太陽電池設置正面図

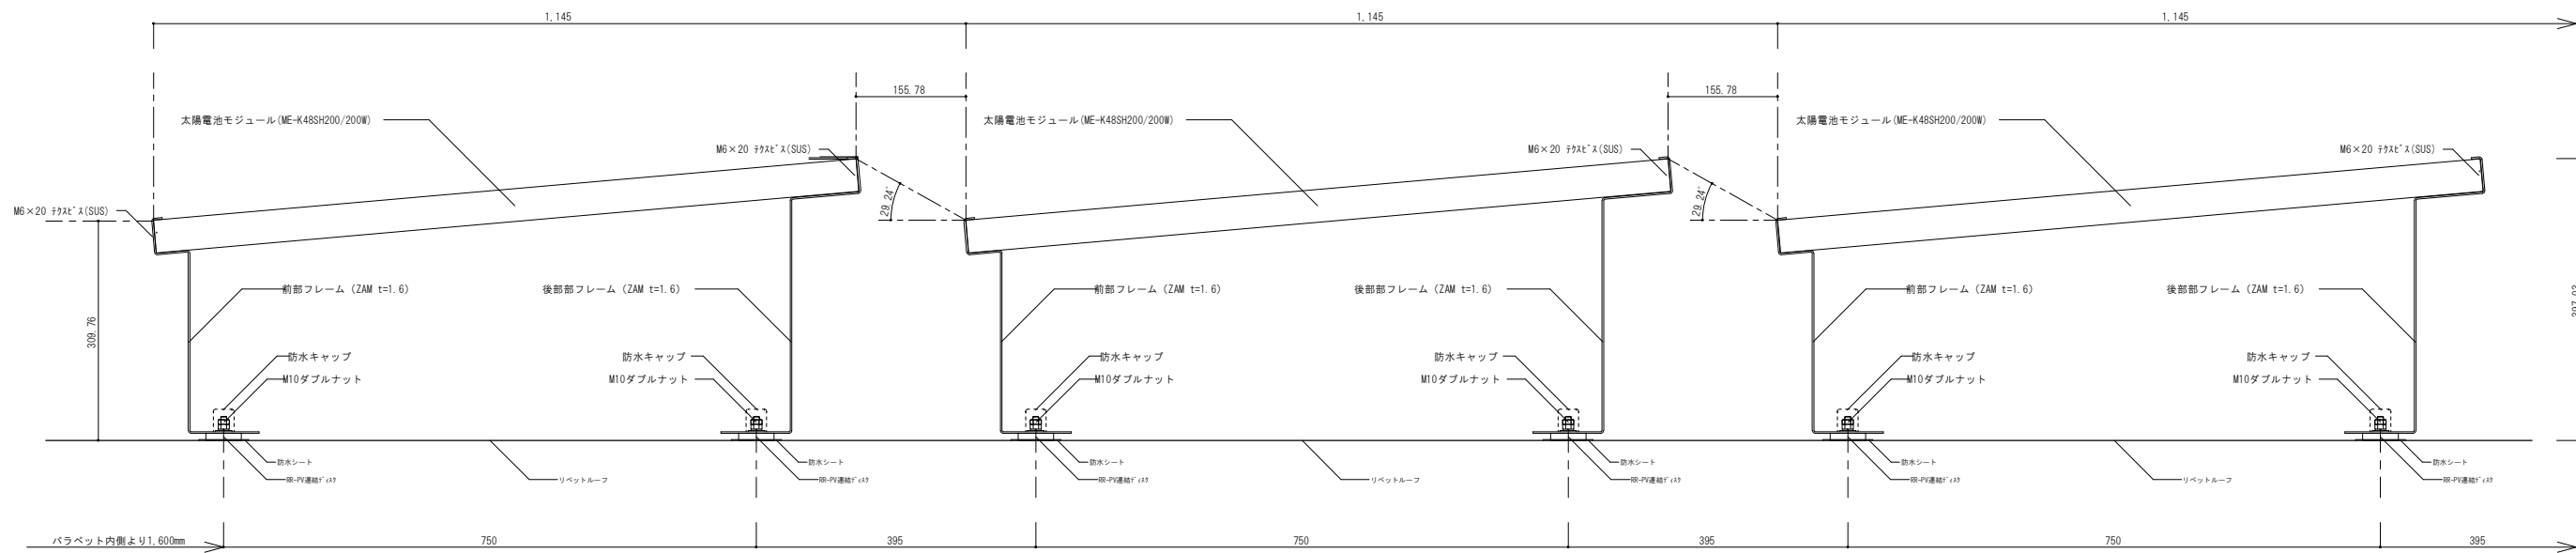

太陽電池設置断面図

				Approve	Check	Drawing	Project Title	Date	Drow No. 6 6 枚の内
							(仮称) 健友会小規模多機能福祉施設太陽光発電設備設置工事	H19. 02. 23	
							Drawing Title	Scale	
							太陽電池設置断面図	S=1/10	

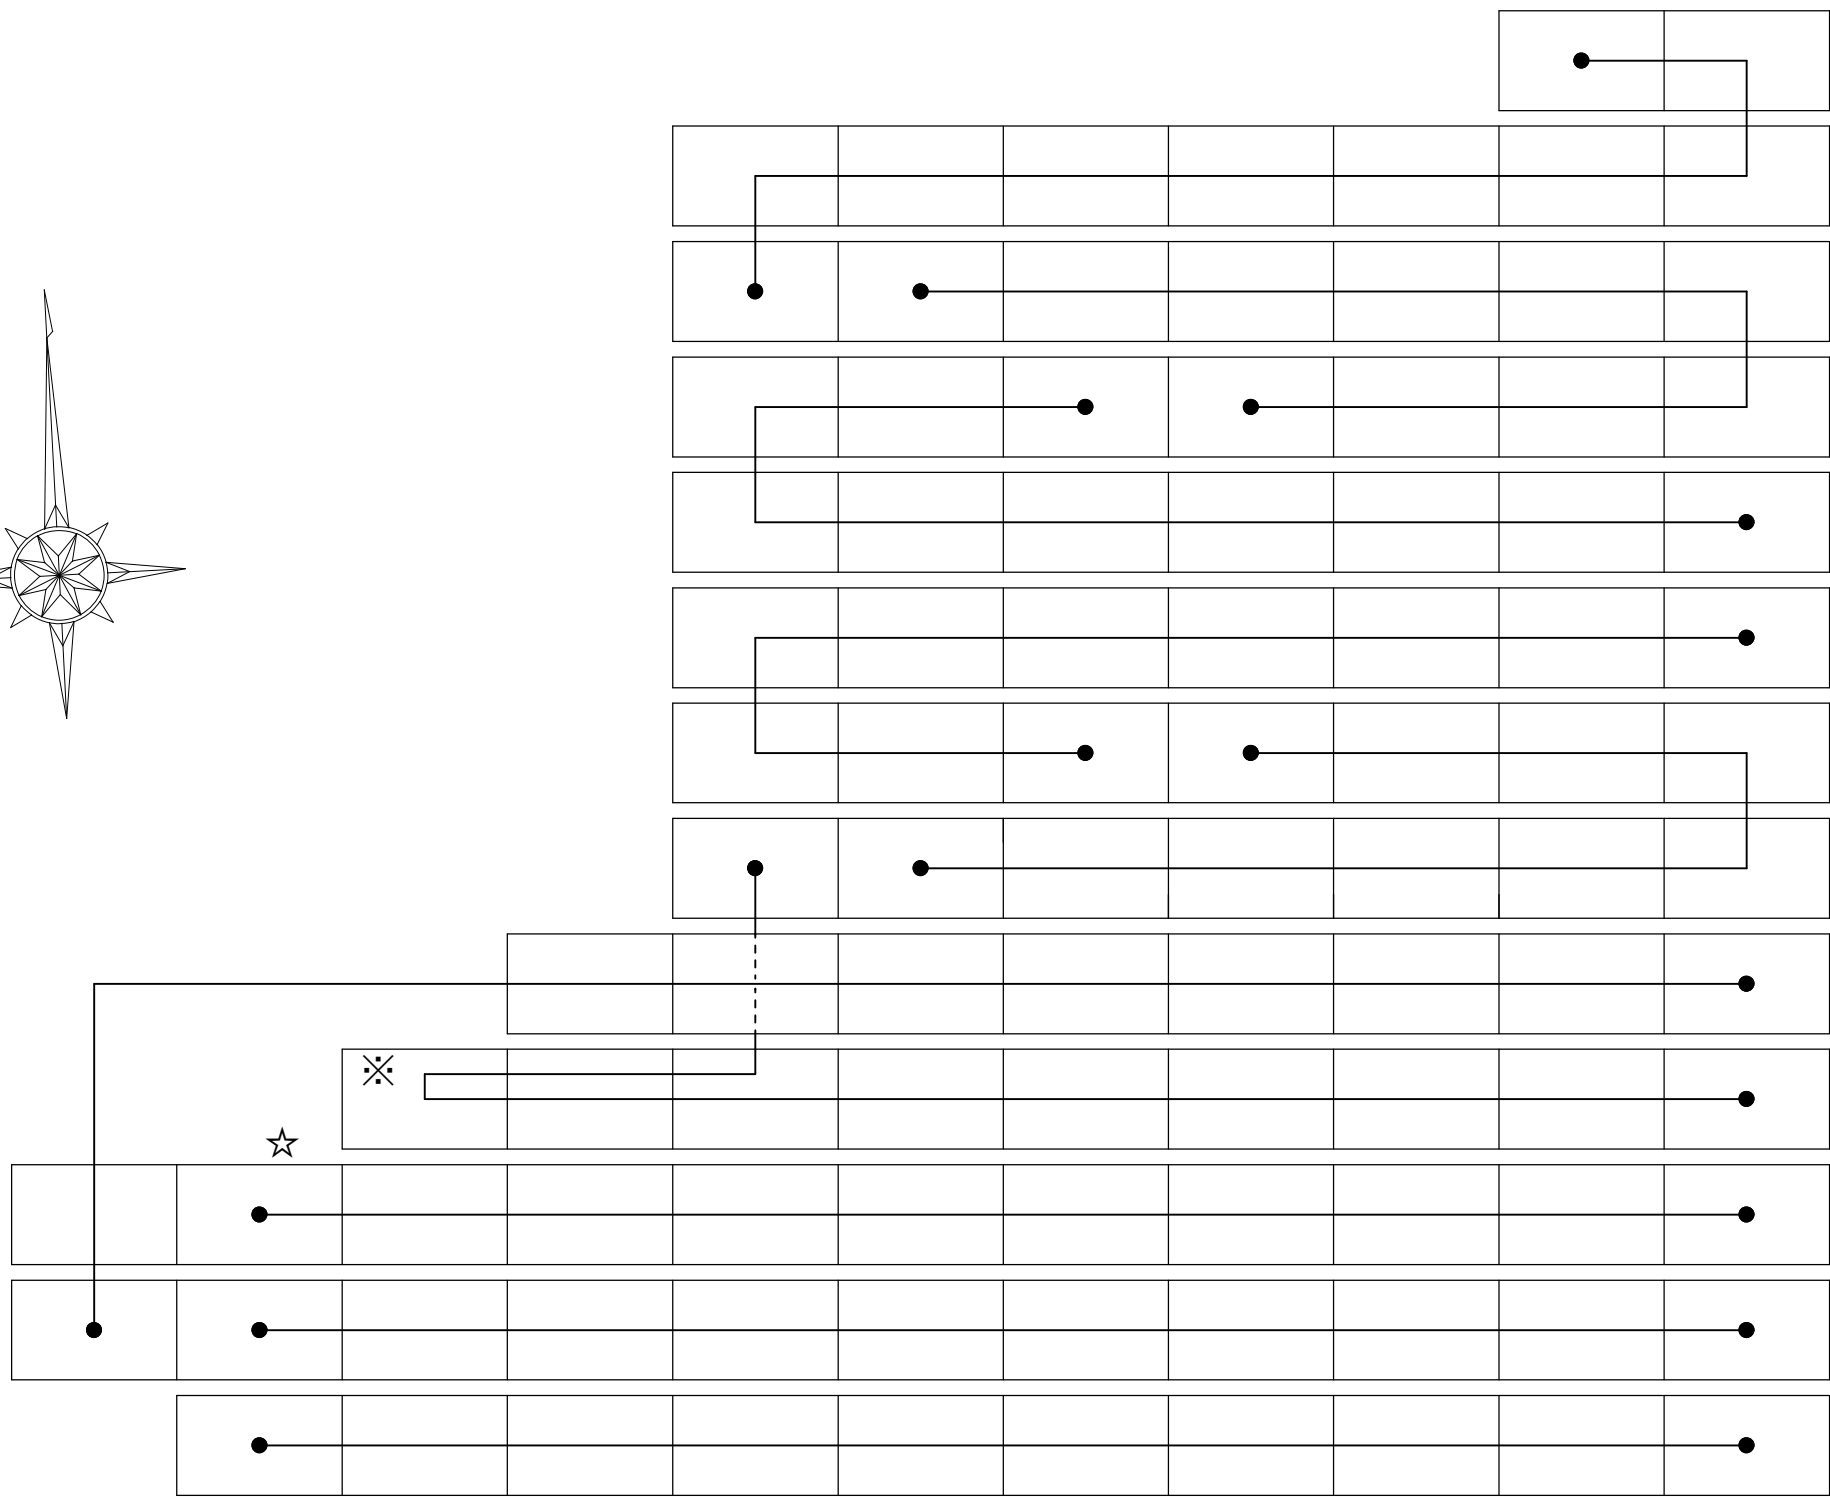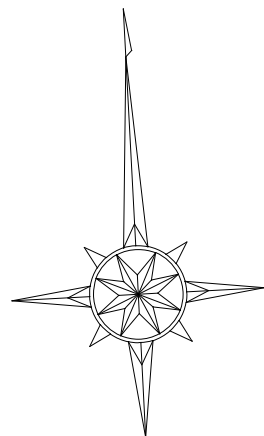

☆ = 日射計
※ = 気温計

			1 0 直列 1 0 並列 1 0 0 枚	Approve	Check	Drawing	Project Title	Date	Drow No. 6 枚の内
			傾斜角度：5. 0 度				(仮称) 健友会小規模多機能福祉施設太陽光発電設備設置工事	H19. 02. 23	
							Drawing Title	Scale	
							太陽電池モジュール結線図		

発行番号: PVS070247
発行日 : 2007年2月21日

太陽電池モジュール 検査成績書

形式 ND-U0L5H

台数 100 台

シャープ株式会社
ソーラーシステム事業本部
品質保証部

承認	担当
	

(PVS070247)

Ser.No		最大電力	最大出力 動作電圧	最大出力 動作電流	開放電圧	短絡電流	絶縁抵抗	耐電圧	外観	総合判定
		Pmax(W)	Vpm(V)	Ipm(A)	Voc(V)	Isc(A)	DC.1000V	DC.2200V 1分間		
		公称値 下限値	200.00 180.00	28.42 -	7.04 -	36.01 -	7.90 -	500MΩ以上 3mA以下		
1	060B00293	213.03	30.15	7.07	36.48	8.12	OK	OK	OK	合格
2	060B00862	216.02	30.03	7.19	36.57	8.15	OK	OK	OK	合格
3	060B01098	216.09	30.49	7.09	36.90	8.02	OK	OK	OK	合格
4	060B01182	213.24	30.08	7.09	36.55	8.14	OK	OK	OK	合格
5	070B00151	206.14	28.56	7.22	35.67	7.86	OK	OK	OK	合格
6	070B00154	207.61	28.82	7.20	36.00	7.95	OK	OK	OK	合格
7	070B00158	211.01	28.71	7.35	35.95	8.07	OK	OK	OK	合格
8	070B00161	208.80	28.60	7.30	35.89	8.05	OK	OK	OK	合格
9	070B00165	208.82	29.69	7.03	36.48	7.82	OK	OK	OK	合格
10	070B00166	208.50	29.59	7.05	36.23	8.05	OK	OK	OK	合格
11	070B00168	210.83	29.25	7.21	36.35	8.04	OK	OK	OK	合格
12	070B00170	206.66	28.86	7.16	35.78	7.95	OK	OK	OK	合格
13	070B00171	209.57	29.16	7.19	36.22	7.95	OK	OK	OK	合格
14	070B00175	208.88	29.06	7.19	36.12	7.91	OK	OK	OK	合格
15	070B00177	206.89	28.88	7.16	35.86	7.94	OK	OK	OK	合格
16	070B00180	208.62	29.58	7.05	36.26	7.91	OK	OK	OK	合格
17	070B00182	209.77	29.23	7.18	36.20	7.97	OK	OK	OK	合格
18	070B00183	208.81	28.83	7.24	35.96	8.01	OK	OK	OK	合格
19	070B00185	206.81	29.25	7.07	36.19	7.92	OK	OK	OK	合格
20	070B00190	203.24	29.13	6.98	35.95	7.67	OK	OK	OK	合格
21	070B00191	210.22	29.50	7.13	36.52	7.87	OK	OK	OK	合格
22	070B00192	206.31	28.82	7.16	35.72	7.96	OK	OK	OK	合格
23	070B00193	207.88	29.03	7.16	36.16	7.86	OK	OK	OK	合格
24	070B00194	207.20	28.97	7.15	35.81	7.91	OK	OK	OK	合格
25	070B00195	207.59	29.25	7.10	36.25	7.73	OK	OK	OK	合格
26	070B00197	207.37	28.93	7.17	35.79	7.91	OK	OK	OK	合格
27	070B00199	205.54	28.73	7.15	35.69	7.85	OK	OK	OK	合格
28	070B00201	207.01	28.41	7.29	35.62	8.13	OK	OK	OK	合格
29	070B00202	207.76	28.52	7.28	35.73	8.06	OK	OK	OK	合格
30	070B00203	207.17	28.40	7.29	35.65	8.09	OK	OK	OK	合格
31	070B00204	208.89	28.71	7.28	35.82	8.10	OK	OK	OK	合格
32	070B00205	208.25	28.60	7.28	35.68	8.02	OK	OK	OK	合格
33	070B00206	207.61	28.33	7.33	35.55	8.08	OK	OK	OK	合格
34	070B00208	210.07	28.88	7.28	35.90	8.01	OK	OK	OK	合格
35	070B00209	210.79	28.87	7.30	35.98	8.02	OK	OK	OK	合格
36	070B00212	208.71	28.71	7.27	35.82	7.95	OK	OK	OK	合格
37	070B00213	210.36	28.83	7.30	35.85	7.96	OK	OK	OK	合格
38	070B00217	208.35	28.70	7.26	35.81	7.98	OK	OK	OK	合格
39	070B00220	210.50	28.51	7.38	36.02	8.14	OK	OK	OK	合格
40	070B00221	208.67	28.88	7.23	35.87	7.97	OK	OK	OK	合格
41	070B00222	208.33	28.97	7.19	36.02	7.99	OK	OK	OK	合格
42	070B00223	206.09	28.71	7.18	35.80	7.91	OK	OK	OK	合格
43	070B00225	217.93	29.31	7.44	36.38	8.24	OK	OK	OK	合格
44	070B00242	217.93	29.23	7.46	36.42	8.26	OK	OK	OK	合格
45	070B00243	205.47	28.88	7.11	35.85	7.91	OK	OK	OK	合格
46	070B00245	217.22	29.34	7.40	36.41	8.21	OK	OK	OK	合格
47	070B00249	217.81	29.23	7.45	36.37	8.28	OK	OK	OK	合格
48	070B00254	209.44	28.38	7.38	36.02	8.17	OK	OK	OK	合格
49	070B00256	208.62	28.37	7.35	35.79	8.23	OK	OK	OK	合格
50	070B00257	207.77	28.88	7.20	35.76	7.99	OK	OK	OK	合格

Irradiance 1000W/m²
Cell Temp 25°C


(PVS070247)

Ser.No		最大電力	最大出力 動作電圧	最大出力 動作電流	開放電圧	短絡電流	絶縁抵抗	耐電圧	外観	総合判定
		Pmax(W)	Vpm(V)	Ipm(A)	Voc(V)	Isc(A)	DC.1000V	DC.2200V 1分間		
		公称値 下限値	200.00 180.00	28.42 -	7.04 -	36.01 -	7.90 -	500MΩ以上 3mA以下		
51	070B00259	208.70	28.42	7.34	35.96	8.18	OK	OK	OK	合格
52	070B00261	208.25	28.23	7.38	35.87	8.25	OK	OK	OK	合格
53	070B00262	208.20	28.30	7.36	35.80	8.15	OK	OK	OK	合格
54	070B00263	208.69	28.26	7.38	35.83	8.19	OK	OK	OK	合格
55	070B00268	216.51	29.20	7.41	36.36	8.27	OK	OK	OK	合格
56	070B00272	203.49	27.75	7.33	35.51	8.13	OK	OK	OK	合格
57	070B00275	204.62	27.83	7.35	35.66	8.14	OK	OK	OK	合格
58	070B00282	213.20	28.74	7.42	36.07	8.27	OK	OK	OK	合格
59	070B00283	214.57	28.77	7.46	36.02	8.28	OK	OK	OK	合格
60	070B00284	212.94	28.82	7.39	36.10	8.16	OK	OK	OK	合格
61	070B00285	207.89	28.50	7.30	35.67	8.12	OK	OK	OK	合格
62	070B00286	210.20	28.78	7.30	36.15	8.06	OK	OK	OK	合格
63	070B00287	207.45	28.49	7.28	35.70	8.05	OK	OK	OK	合格
64	070B00288	207.62	28.61	7.26	35.68	8.08	OK	OK	OK	合格
65	070B00290	204.40	28.17	7.26	35.63	8.15	OK	OK	OK	合格
66	070B00292	210.30	28.38	7.41	35.93	8.17	OK	OK	OK	合格
67	070B00296	218.29	29.10	7.50	36.33	8.33	OK	OK	OK	合格
68	070B00299	218.55	28.98	7.54	36.20	8.36	OK	OK	OK	合格
69	070B00300	209.58	28.59	7.33	35.67	8.06	OK	OK	OK	合格
70	070B00301	210.46	28.77	7.31	35.90	8.20	OK	OK	OK	合格
71	070B00302	207.83	28.36	7.33	35.85	8.24	OK	OK	OK	合格
72	070B00305	217.18	28.87	7.52	36.07	8.33	OK	OK	OK	合格
73	070B00306	208.15	28.26	7.36	35.86	8.16	OK	OK	OK	合格
74	070B00308	208.49	28.26	7.38	35.89	8.24	OK	OK	OK	合格
75	070B00309	208.09	28.25	7.37	35.83	8.25	OK	OK	OK	合格
76	070B00310	218.10	28.95	7.53	36.31	8.29	OK	OK	OK	合格
77	070B00311	216.82	28.96	7.49	36.26	8.24	OK	OK	OK	合格
78	070B00312	218.64	28.93	7.56	36.36	8.27	OK	OK	OK	合格
79	070B00350	218.51	29.19	7.49	36.26	8.25	OK	OK	OK	合格
80	070B00351	216.71	28.96	7.48	36.18	8.25	OK	OK	OK	合格
81	070B00401	210.42	28.76	7.32	35.93	8.03	OK	OK	OK	合格
82	070B00408	207.81	28.77	7.22	35.70	7.94	OK	OK	OK	合格
83	070B00410	209.09	28.83	7.25	35.78	7.92	OK	OK	OK	合格
84	070B00415	210.02	28.91	7.27	35.90	7.93	OK	OK	OK	合格
85	070B00416	212.75	29.01	7.33	36.10	8.05	OK	OK	OK	合格
86	070B00420	208.62	28.60	7.29	35.67	7.92	OK	OK	OK	合格
87	070B00422	208.68	28.55	7.31	35.64	7.95	OK	OK	OK	合格
88	070B00425	211.50	29.00	7.29	36.02	7.97	OK	OK	OK	合格
89	070B00426	210.47	28.98	7.26	35.96	7.96	OK	OK	OK	合格
90	070B00428	208.44	28.63	7.28	35.63	7.94	OK	OK	OK	合格
91	070B00429	208.90	28.75	7.27	35.77	8.00	OK	OK	OK	合格
92	070B00430	208.48	28.52	7.31	35.72	7.95	OK	OK	OK	合格
93	070B00432	208.45	28.68	7.27	35.70	7.99	OK	OK	OK	合格
94	070B00433	208.77	28.60	7.30	35.72	7.96	OK	OK	OK	合格
95	070B00434	209.46	28.67	7.30	35.81	7.97	OK	OK	OK	合格
96	070B00436	205.11	29.47	6.96	35.98	8.00	OK	OK	OK	合格
97	070B00437	209.62	28.80	7.28	35.87	7.99	OK	OK	OK	合格
98	070B00438	208.84	28.74	7.27	35.80	8.00	OK	OK	OK	合格
99	070B00439	211.25	29.00	7.28	36.03	8.03	OK	OK	OK	合格
100	070B00443	206.63	28.52	7.25	35.66	8.01	OK	OK	OK	合格

TOTAL 20997.93

Irradiance 1000W/m²
Cell Temp 25°C

発 注 形 態

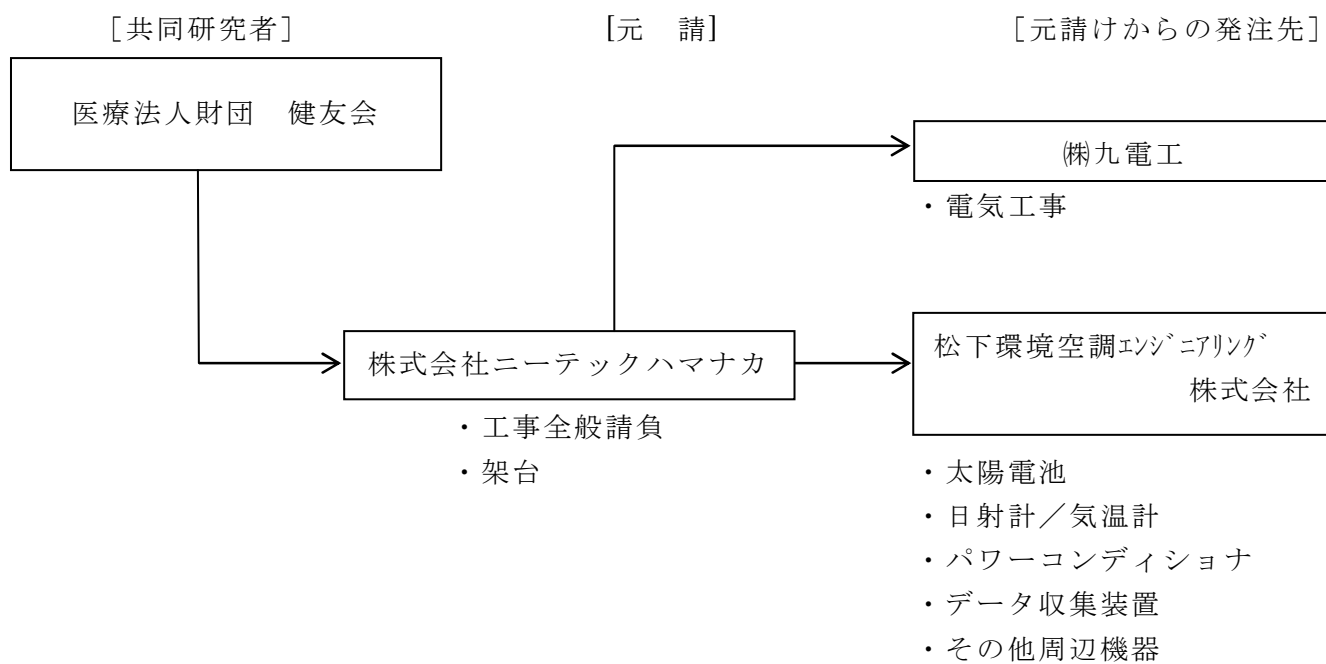

共同研究費（実績額）内訳書

添付資料 5

共同研究項目：（仮称）健友会小規模多機能福祉施設新技術等フィールドテスト事業

採択番号： 8703201

（共同研究者： 医療法人財団 健友会 ）

区分	金額（円）	内 訳（円）	【 工 数 】	【 金額（円） 】
I. 機械装 置等費	21,000,000	1. 土木・建築工事費		[5,700,000]
		（1）基礎関係工事費		< 1,100,000 >
		・基礎工事費[架台、キュービクル 等]	1 式＝	0
		・屋根修復工事費	1 式＝	1,100,000
		（2）装置据付等工事費		< 4,600,000 >
		○装置据付工事費		(2,500,000)
		・太陽電池据付工事費	1 式＝	420,000
		・インバータ据付工事費	1 式＝	200,000
		・架台組立工事費	1 式＝	620,000
		・キュービクル据付工事費	1 式＝	0
		・システム保護装置等組立配線費	1 式＝	0
		・データ計測装置据付工事費	1 式＝	250,000
		・運搬費	1 式＝	265,000
		・諸経費 他	1 式＝	745,000
		○試験調整費		(450,000)
		・システム保護装置試験費	1 式＝	0
		・インバータ試験費	1 式＝	25,000
		・計測装置調整費	1 式＝	25,000
		・システム調整試験費（含む検査費）	1 式＝	400,000
		○電気配線配管等工事費		(1,650,000)
		・電気配線配管等工事費	1 式＝	1,050,000
		・配線配管材料費	1 式＝	600,000
		（3）表示装置関連工事費	1 式＝	< 0 >
		2. 機械装置等製作・購入費		[15,300,000]
		（1）太陽電池本体	490 千円/kW× 20 kW	< 9,800,000 >
		（2）インバータ（インバータ保護装置含）	135 千円/kW× 20 kW	< 2,700,000 >
		（3）付帯設備		< 1,750,000 >
		○太陽電池アレイ架台		(1,750,000)
		・パネル用架台	875 千円/kW× 20 kW	1,750,000
		・H鋼(ベースチャネル)	使用鋼材： 0 トン	1 式＝ 0
		・接続箱	使用数量： 0 個	1 式＝ 0
		○キュービクル	使用数量： 0 架	1 式＝ (0)
		○システム保護装置等		(0)
		・連系保護装置	1 式＝	0
		・直流電源装置	容量： 0 A h	1 式＝ 0
		・収納盤等（含むブレーカ等）	1 式＝	0
		○蓄電装置	0 A h	1 式＝ (0)
		（4）データ計測装置等		< 1,050,000 >
		・データ計測装置（含、トランスジューサ等）	1 式＝	970,000
		・無停電電源装置	容量： 1 A h	1 式＝ 80,000
		（5）表示装置	1 式＝	< 0 >
III. その他 経費	0	2. 旅費	1 式＝	[0]
		5. 報告書等作成費	1 式＝	[0]
小 計	21,000,000			
IV.	2,100,000	一般管理費	一般管理費率＝75.0％	21,000 千円× 10.0％＝ [2,100,000]
総経費	23,100,000			
消費税	1,155,000		上記の 5％	
合 計	24,255,000			

注1）網掛けの欄に入力してください。

注2）共同研究費（実績額）内訳書は、丸めず円単位まで記入する。
